

**PROJEKAT
INKLUZIVNO PREDŠKOLSKO VASPITANJE I
OBRAZOVANJE - (IPVO)**

**KONTROLNA LISTA PLANA ZA UPRAVLJANJE
ŽIVOTNOM SREDINOM I SOCIJALNIM PITANJIMA**

**Renoviranje i opremanje (tekuće održavanje) vaspitnih soba u
predškolskoj ustanovi u**

Opštini Požega

Beograd, Jul 2022. godine

Sadržaj

1. Uvod i polazne osnove.....	4
1.1. Rezime projekta	4
1.2. Renoviranje i opremanje postojećih soba za vaspitno-obrazovni rad Aktivnosti i lokacija	5
1. Tekuće održavanje i opremanje 2 sobe u Opštini Požega	5
2. PLAN UPRAVLJANJA I PRAĆENJA ŽIVOTNE SREDINE ZA RENOVIRANJE I OPREMANJE POSTOJEĆIH VASPITNIH SOBA	11
DEO 1: Institucionalno administrativni	11
DEO 2: Ekološka i socijalna procena	19
DEO 3: Plan monitoringa.....	27
Prilozi.....	36
Prilog 01: Zaštita životne sredine i socijalno okruženje	36
Prilog 02: Lokacije objekata u Opštini Požega	37
Prilog 03: Nalaz građevinskog inspektora	38
Prilog 04: Žalbeni formular	39

Spisak skraćenica

IPVO – Projekat „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje”
ZZPS – Zavod za zaštitu prirode Srbije
JLS – Jedinica lokalne samouprave
JUP – Jedinica za upravljanje projektom
KO – Katastarska opština
MZŽS – Ministarstvo zaštite životne sredine
MPNTR – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
MRZBSP - Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
MSA – Materijal koji sadrži azbest
NVO – Nevladina organizacija
OA – Oksidi azota
ODUŽSSO – Okvirni dokument za upravljanje životnom sredinom i socijalnim okruženjem
OPR – Okvirna politika raseljavanja
OP – Operativna politika
OP/BP – Operativna procedura / politika Banke
PAU – Policiklični aromatični ugljovodonici
PŽS – Procena životne sredine
PzUŽSSO – Plan za upravljanje životnom sredinom i socijalnim okruženjem
PUŽS – Procena uticaja na životnu sredinu
PUUSO – Plan za ublažavanje uticaja na socijalno okruženje
RZZSK – Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
RS – Republika Srbija
SB – Svetska banka
SGRS – Službeni glasnik Republike Srbije

1. Uvod i polazne osnove

Projekat inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja (ECEC) koji se finansira iz sredstava Zajma Svetske banke (Banka), a koji sprovodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, će direktno koristiti deci od rođenja do uzrasta od 6,5 godina, posebno deci iz društveno osetljivih grupa. Projekat će deci iz društveno osetljivih grupa pružiti neophodnu prednost od ključnog značaja u pogledu ukupnog razvoja, inkluzije u obrazovanju i sticanja obrazovanja. Projekat se sprovodi od 2018. godine. Projekat se provodi u skladu s Operativnim Politikama Svetske banke, uključujući politike zaštite životne sredine i društvenih pitanja.

Prema Politici i Proceduri 4.01 Operativne politike Svetske Banke za zaštitu životne sredine, Banka zahteva da izradu Procene uticaja na životnu sredinu i društvo za projekte koji su predloženi za finansiranje iz kredita Banke, kako bi osigurala da su projekti ekološki i društveno prihvatljiviji, usuglašeni sa Politikama i Procedurama Svetske banke u području zaštite životne sredine i socijalnih pitanja, primenjivim nacionalnim zakonodavstvom, Smernicama Svetske banke u zaštiti životne sredine i socijalnih pitanja te najboljim praksama, te da se vode održivim procesom odlučivanja. Također, prema Operativnoj Politici i Proceduri Svetske banke 4.11 Kulturno fizičko dobro, koje se također primenjuje na ovaj projekat, na lokalitetima i objektima koji se nalaze pod bilo kojim vidom zaštite kulturnog i arheološkog nasleđa, potrebno je izraditi Plan upravljanja kulturnim dobrom, a u skladu sa navedenom Politikom i nacionalnim zakonima. PROJEKAT INKLUZIVNO PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE (ECEC), predviđa širenje pristupa kvalitetnim ECEC uslugama, posebno za decu iz društveno osetljivih grupa.

1.1. Rezime projekta

Cilj projekta je unapređenje dostupnosti, kvaliteta i pravičnost za decu predškolskog uzrasta (sa ova tri međusobno povezana aspekta koja se odražavaju u tri komponente projekta) od 0 do 6,5 godina, sa posebnim naglaskom na decu iz društveno osetljivih grupa. Aktivnosti za decu uzrasta od 3 do 6,5 godina (posebno u komponentama 1 i 2) biće usmerene na povećanje dostupnosti inkluzivnom predškolskom obrazovanju i vaspitanju (tj. Usmereno na dete i sa mogućnostima učenja prilagođene uzrastu), istovremeno podržavajući njihov prelazak u rane razrede osnovnog obrazovanja. Aktivnosti za mlađu decu, tj. od rođenja pa nadalje (u komponenti 3), biće usmerene na osnaživanje roditelja i porodica da podrže holistički razvoj dece kroz unapređenje znanja o značaju ranog razvoja i rane stimulacije kod kuće i pristupu relevantnim uslugama u zajednici. Konačno, komponenta 4 će se fokusirati na upravljanje projektima i praćenje i evaluaciju.

Komponenta 1: Proširenje ponude slobodnih mesta u predškolskim ustanovama.

Cilj ove komponente jeste da unapredi pristup predškolskim uslugama, posebno za decu uzrasta 3 do 5, 5 godina iz društveno osetljivih grupa, tako što će povećati ponudu slobodnih mesta u kvalitetnim predškolskim ustanovama. Prioriteti u prvim fazama sprovođenja Projekta biće renoviranje i prenamena/unapređenje, kako bi se time brzo povećao pristup, dok izgradnja novih objekata iziskuje više vremena.

Obnovljeni objekti biće pogodni za vaspitnoobrazovne aktivnosti orijentisane ka deci i koristiće rešenja koja povećavaju efikasnost i fleksibilnost. Za sve nove i obnovljene predškolske ustanove ova komponenta će finansirati nabavku nameštaja, didaktičkog materijala, opreme i opremanje igrališta.

1.2. Renoviranje i opremanje postojećih soba za vaspitno-obrazovni rad Aktivnosti i lokacija

1. Tekuće održavanje i opremanje 2 sobe u Opštini Požega

Opština Požega je opština u Srbiji, u Zlatiborskom okrugu. Središte opštine je grad Požega. Udaljena je od Beograda 180 km i od Užica 25 km. Zahvata površinu od 426,5 km², ima 42 naselja i 55 katastarskih opština. Nalazi se u prostranoj i osunčanoj kotlini u kojoj se granaju donji tokovi Skrapeža, Golijske Moravice i Đetinje od kojih nastaje Zapadna Morava.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku za 2020. godinu na teritoriji opštine živi 26954 stanovnika dok je gustina naseljenosti iznosi 63 stanovnika na km². Prosečan broj članova domaćinstva je 3,02.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku broj poljoprivrednih gazdinstava 2012. godine je 5645, dok je površina korišćenog poljoprivrednog zemljišta bila 17947 ha, odnosno: 223,32 ha za okućnice, 5617,37 ha za oranice i baste, 2614,05 ha za voćnjake, 0,42 ha za vinograde, 23,32 ha za ostale i stalne zasade i 9468,92 ha za livade i pašnjake – ukupno. Broj grla stoke za 2012. godinu je bio ukupno 184259, odnosno: 135976 živine, 27251 ovaca, 13948 svinja, 7084 goveda.

Prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku za 2020. godinu broj ustanova predškolskog obrazovanja je 1, a broj objekata ustanova predškolskog obrazovanja je 9. Obuhvat dece uzrasta 0-3 godine predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem je 37,9 %, odnosno 192 dece dok je obuhvat dece uzrasta od 3 godine do polaska u PPP predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem 86,5 %, odnosno 468 dece. Broj dece koja pohađaju predškolski pripremni program je 229.

Čitavo područje Požege predstavlja široku prirodnu kotlinu koja zauzima oblast oko gornjeg toka Zapadne Morave i donjih tokova reka Skrapež i Đetinje, smeštena je između Ovčara i Kablara na istoku, Trešnjice na zapadu, Maljena na severu i Blagaje na jugu.

S obzirom da se na ovim prostorima naselja nalaze na različitim nadmorskim visinama, od 310 do 900m, tako se i tipovi sela razlikuju u zavisnosti od toga da li su u ravničarskim ili brdsko-planinskim predelima. U oblastima veće nadmorske visine kuće su međusobno udaljene ili grupisane po zaseocima, a u ravničarskim predelima građene su blizu jedna drugoj.

Brdsko-planinska područja naše opštine odlikuju se hladnim i snežnim zimama i umereno toplim letima, dok su u nižim predelima zime nešto blaže, a leta toplija.

Lokacija

Na inicijativu centra za socijalni rad 1961. godine počinje izgradnja prvog objekta za predškolsku decu, koji je završen 1965, kapaciteta 80 dece sa 5 radnih soba. Od prvih 7 radnika tadašnjeg vrtića, vaspitno obrazovni rad su realizovala 3 učitelja.

Nakon izgradnje prvog objekta, vrtić stiče određeni renome, to je vreme intenzivnog razvoja privrede, pa rastu potrebe za novim prostorom i kadrovima.

Dan otvaranja novog objekta 3. februara 1977 godine proglašen je za Dan ustanove, kada je dobila današnji naziv "Olga Jovičić - Rita". Objekat je smešten u delu grada (takozvana Radovina), ul. Svetosavska 9, kapaciteta 210 dece.

Deset godina kasnije, u rad se pušta objekat u ulici Zmajeva 1, u delu grada III Reon kapaciteta 180 dece (3 jaslene i 8 vrtićnih grupa). 2010. godine otvaranja se treći objekta kapaciteta 160 dece u ulici Bana Milutina bb.

Predškolska ustanova radi i van sedišta organizovanjem izdvojenih odeljenja za realizaciju PPP u objektima Osnovnih škola „Petar Leković“ i „Emilija Ostojić“.

Negu i vaspitanje dece do 3 godine realizuju sestre vaspitači, na osnovu Programa vaspitno obrazovnog rada nege i zdravstvene zaštite.


Predmet projekta su prostorije koje se nalaze u okviru objekta osnovne škole „Petar Leković“ kao izdvojeno odeljenje PU „Olga Jovičić - Rita“. Sam objekat je izgrađen pre rata 1938. godine, bez građevinske dozvole i adaptiran je 1990. godine. Objekat se uvek koristio kao osnovna škola prvo kao osmogodišnja, a kasnije kao četvorogodišnja. Škola ima četiri učionice, prostor za fiskulturu, toalete, kancelariju, veliki hodnik, kotlarnicu i potkrovlje koje se ne koristi. Trenutno su zaposlena dva učitelja u kombinovanim razredima, i dve vrtićne grupe.

Za potrebe izdvojenog odeljenja predškolske ustanove se koriste dve prostorije, koje su i predmet ovog projekta, jaslena soba od 56 m² i soba za mešovitu grupu površine 56 m².

Objekat izdvojenog odeljenja O.Š. Petar Leković u Zdravčićima nalazi se u centralnom delu naselja Zdravčići neposredno uz magistralu Zdravčićki put. Ukupna bruto površina objekta je 270 m². Objekat ima veliko ograđeno dvorište za aktivnosti sa decom i okružen je zelenilom, uglavnom šumarcima i oranicama. Objekat je priključen na gradski vodovod i kanalizaciju i ima sopstvenu kotlarnicu na pelet. U blizini nema značajnih zagađivača vazduha. Naselje Zdravčići se nalazi na oko 5 km od centra Požege prema zapadu. U okolini objekta preovlađuju niske građevine i stambene kuće sa okućnicama, kao i oranice, baste, voćnjaci i šumarci, karakteristične za ovaj tip naselja u opštini. U neposrednoj blizini se ne nalaze verski objekti, spomenici kulture ili prirode.

Naziv predškolske ustanove?	P.U. „Olga Jovičić Rita“.
Naziv objekta/objekata u kome se nalazi soba za koju se planira planira rekonstrukcija	Objekat u kome se nalaze prostorije planirane za rekonstrukciju je O.Š. Petar Leković u Zdravčićima
	Naziv objekta i površina
Soba 1	Jaslena soba (površina 56 m ²).
Soba 2	Soba za mešovitu grupu (površina 56 m ²).

Objekat ne predstavlja kulturno dobro - spomenik kulture. Objekat ne pripada prostoru koji je deo zaštićenog prirodnog dobra ili zone zaštite prirodnog dobra. U tom kontekstu objekat nije u režimu zaštite po osnovu zaštite prirode ili zaštite kulturnoistorijskog objekta ili celine.

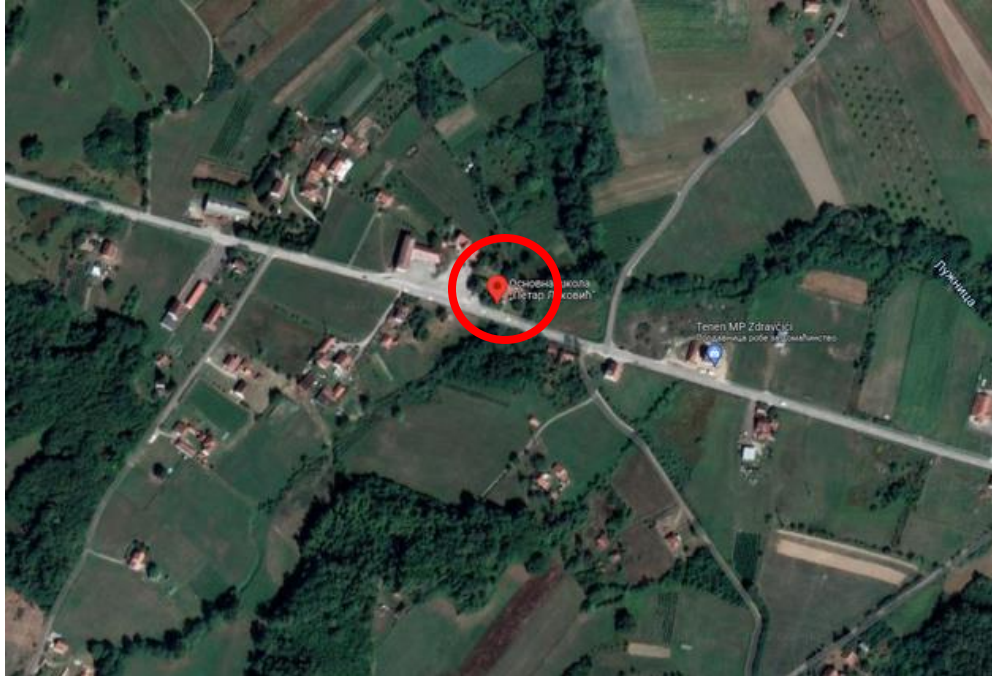

Slika 1. Lokacija objekta Predškolske ustanove u Zdravčićima

Zemljište na kojem su izgrađeni objekti, kao i okolno zemljište, koristi se kao zemljište za uglavnom za stambenu izgradnju i poljoprivredu i u njegovoj bližoj okolini nema izvora zagađenja.



Slika 2. Spoljašnji izgled objekta Predškolske ustanove u Zdravčićima



Slika 3. Unutrašnjost objekta Predškolske ustanove u Zdravčićima

U prilogu 02 je prikazana mikrolokacija objekta.

Osnovne informacije o P.U. „Olga Jovičić Rita“ su dostupne na sledećoj internet strani:

<https://www.predskolskopozega.edu.rs/>

Tokom izvođenja radova rad predškolske ustanove će biti organizovan tako da će deci iz predškolske grupe, koja još uvek ne koriste objekat biti ponuđen objekat u gradu. Objekat se koristi kao škola i nakon renoviranja 2 sobe će se koristiti za potrebe predškolske ustanove

Opis projekta

Projekat je ograničen na unutrašnje radove klasifikovane kao tekuće održavanje, u skladu sa članom 2. Zakona o planiranju i izgradnji, tačka 36a) u kojoj se navodi: “tekuće (redovno) održavanje objekta jeste izvođenje radova koji se preduzimaju radi sprečavanja oštećenja koja nastaju upotrebom objekta ili radi otklanjanja tih oštećenja, a sastoje se od pregleda, popravki i preduzimanja preventivnih i zaštitnih mera, odnosno svi radovi kojima se obezbeđuje održavanje objekta na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti, kao što su krečenje, farbanje, zamena obloga, zamena sanitarija, radijatora, zamena unutrašnje i spoljašnje stolarije i bravarije, zamena unutrašnjih instalacija i opreme bez povećanja kapaciteta i drugi slični radovi, ako se njima ne menja spoljni izgled zgrade i ako nemaju uticaj na zajedničke delove zgrade i njihovo korišćenje...” Za izvođenje radova na tekućem održavanju objekta nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa za gradnju, odnosno akt za izvođenje radova. Projekat ne predviđa intervencije na fasadi objekta, kao ni na ulazu, stepeništu, krovu. Projekat je ograničen isključivo na radove unutar prostorija.

U predmetnim prostorijama planirani su sledeći radovi:

Rušenje i demontaža

- Demontaža laminata
- Demontaža vinas ploča
- Demontaža keramičkih pločica
- Demontaža lamperije na zidu
- Demontaža stolarije, pregradnih vrata u prostorijama

Zidarski radovi

- Postavljanje mrežice i lepka na unutrašnje zidove prostorija
- Izrada obloge zidova, postavljanje vinila na zidne površine od gotovog poda do 1.50m visine.

Podopolagački radovi

- Izrada obloge podova, već postojećeg laminata sa lajsnama nakon montiranja pregradnog zida toaleta
- Izrada obloge podova - vinil poda

Stolarski radovi

- Izrada, transport i ugradnja unutrašnjih dvokrilnih vrata od PVC-a sa staklom, bele boje
- Izrada, transport i ugradnja unutrašnjih jednokrilnih vrata (kraft master vrata)
- Izrada, transport i ugradnja ALU pregrada između toaletnih šolja u kupatilu
- Izrada, transport i ugradnja podprozorskih dasaka od tabli belog univera d=1.5cm sa kant trakom

Keramičarski radovi

- Oblaganje podova prostorije, jednoboynim glaziranim protivkliznim keramičkim pločicama, A klase, veličine i boje po izboru projektanta
- Oblaganje zidnih površina u prostoriji, keramičkim zidnim pločicama od gotovog poda do plafona u kabini, dok na preostalim zidovima oblagati od gotovog poda do 1.50 m visine. Dim. i boje po izboru projektanta

Gipsarski i molersko-farbarski radovi

- Izrada obloge zida od impregniranih gips - kartonskih ploča od poda do plafona
- Izrada pregradnog zida W112 od impregniranih gips - kartonskih ploča
- Gletovanje gipsanih površina poligit masom i kompletna priprema površina za kasnije nanošenje boje
- Bojenje zidova u svim prostorijama objekta vodoperivom bojom
- Bojenje plafona u svim prostorijama objekta poludisperzivnom bojom

Vodovod i kanalizacija

- Izrada nove vodovodne i kanalizacione mreže za jedno kupatilo. Prokopavanje kanala za cev Ø110 do postojeće šahte i spajanje na kanalizacionu mrežu

Elektroinstalacije

- Izrada elektroenergetskih instalacija razvoda i osvetljenja unutar prostorije objekta. Izrada jednog sijaličnog mesta i jednog prekidača


Sanitarije

- Nabavka i montaža sanitarija i opreme za kupatilo


Ostali radovi

- Štucna za dimnjak
- Ventilacija

Po završenim radovima na unutrašnjem uređenju, nakon detaljnog čišćenja dopremiti nameštaj i didaktički material u skladu sa prethodno odobrenim karakteristikama nameštaja (odobreni Katalog nameštaja za ceo projekat), nacionalnim zakonima i standardima, i merama koje su definirane u ovom dokumentu.

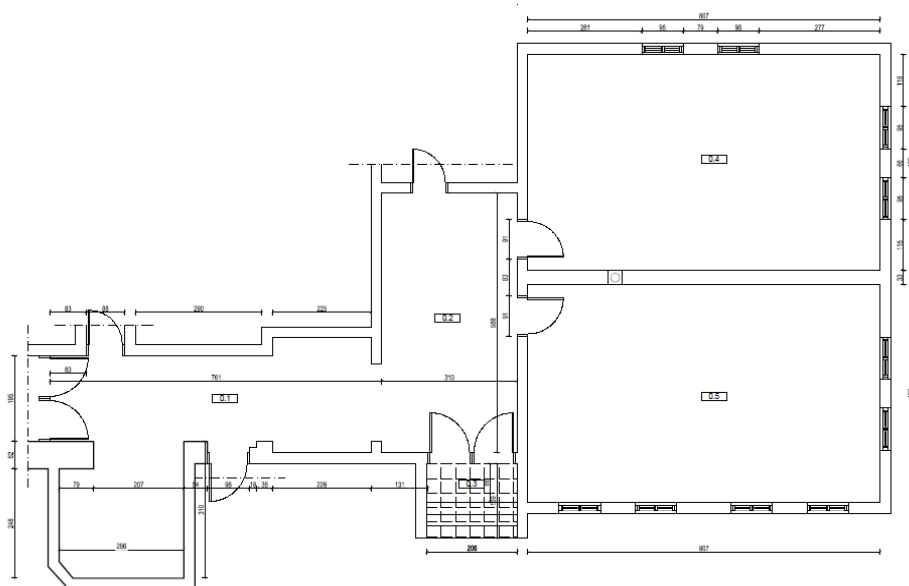

Slika 4. Osnova postojećeg stanja

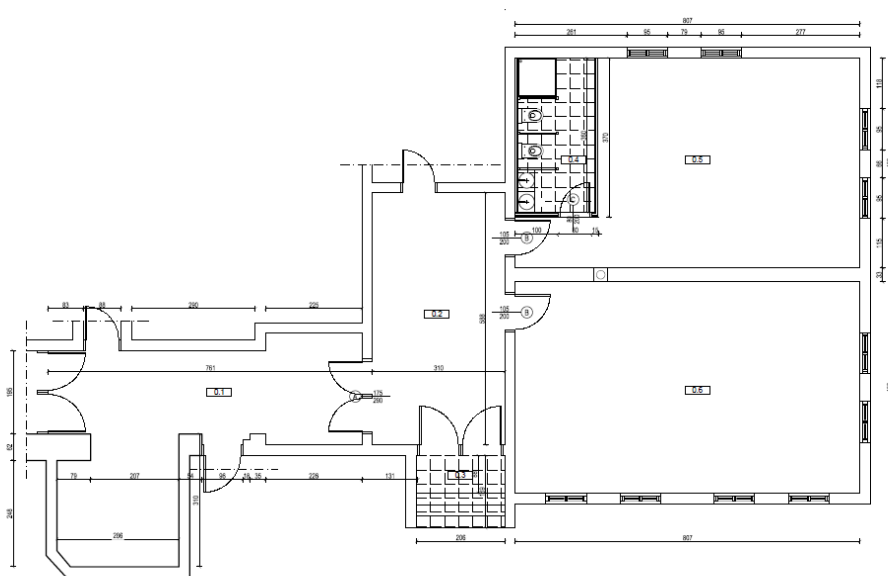

Slika 5. Osnova novoprojektovanog stanja

2. PLAN UPRAVLJANJA I PRAĆENJA ŽIVOTNE SREDINE ZA RENOVIRANJE I OPREMANJE POSTOJEĆIH VASPITNIH SOBA

DEO 1: Institucionalno administrativni

1. Deo: INSTITUCIONALNI I ADMINISTRATIVNI				
Država	Republika Srbija			
Naziv podprojekta	„INKLUZIVNO PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE“ Renoviranje i opremanje postojećih vaspitnih soba u vrtićima u opštinama 1. Predškolska ustanova u opštini Požega (2 sobe)			
Obim aktivnosti projekta	Tekuće održavanje i opremanje			
Institucionalni aranžmani (Ime i kontakti)	SB: Ivana Ivičić Selma Ljubijankić Ivana Novaković	MPNTR: Sanja Štrbac Musmar	Lokalnim partnerima i / ili Primalac i:	
Odgovoran za sprovođenje (Ime i kontakti)	Fondacija Novak Đoković Miljan Lazetić	Fondacija Novak Đoković Miljan Lazetić	Predškolska ustanova „Olga Jovičić Rita“ (2 sobe)	
OPIS LOKACIJE				
Naziv lokacije	Objekat u opštini Požega (2 sobe)			
Opis lokacije	Objekat izdvojenog odeljenja O.Š. Petar Leković u Zdravčićima nalazi se u centralnom delu naselja Zdravčići neposredno uz magistralu Zdravčićki put. Ukupna bruto površina objekta je 270 m ² . Objekat ima veliko ograđeno dvorište za aktivnosti sa decom i okružen je zelenilom, uglavnom šumarcima i oranicama. Objekat je priključen na gradski vodovod i kanalizaciju i ima sopstvenu kotlarnicu na pelet. U blizini nema značajnih zagađivača vazduha. Naselje Zdravčići se nalazi na oko 5 km od centra Požege prema zapadu. U okolini objekta preovlađuju niske građevine i stambene kuće sa okućnicama, kao i oranice, baste, voćnjaci i šumarci, karakteristične za ovaj tip naselja u opštini. U neposrednoj blizini se ne nalaze verski objekti, spomenici kulture ili prirode.		Prilog 02: Mapa lokacija DA <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> Mapa lokacija je priložena u Prilogu 02 ovog dokumenta	
Ko je vlasnik zemlje?	Opština Požega je osnivač Predškolske ustanove, u skladu sa članom 20. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14-dr zakon, 101/16-dr.zakon i 47/18).			

1. Deo: INSTITUCIONALNI I ADMINISTRATIVNI

	<p>Opština Požega je isključivi nosilac prava javne svojine na k.p. br. 720 KO Zdravčiči i objektima na navedenoj parceli, a imaoc prava svojine na objektu je Opština Požega, na navedenoj parceli, a koja se nalazi u ulici Zdravčički put 98. Objekat je sazidan pre rata, 1938. godine bez građevinske dozvole ali je adaptiran 1990. godine. S obzirom da je objekat izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji objekata, za potrebe realizacije tekućeg održavanja dela škole, odnosno za potrebe PU „Olga Jovičić Rita“ Požega, angažovan je građevinski inspektor sa zadatkom sačinjavanja izveštaja. U predmetnom izveštaju građevinskog inspektora, Odeljenja za inspekcijske poslove – građevinska inspekcija, opštinske uprave Opštine požega, sačinjenom u martu 2022. godine, između ostalog, se navodi: “Da je objekat građen od čvrstog materijala (puna opeka u malteru), pokriven crepom preko drvene krovne konstrukcije i da je fasada malterisana i bojena fasadnom bojom, da je vizuelnim pregledom utvrđeno da na objektu nema oštećenja na zidovima i drugim konstruktivnim elementima koja bi ukazivala na nestabilnost kosntrukcije objekta i nebezbednost istog za korišćenje, da nisu vidljivi ugibi u međuspratnoj konstrukciji i krovnoj konstrukciji kao i da nije došlo do sleganja tla ispod objekta. S obzirom na navedeno konstatuje se da statička stabilnost objekta nije ugrožena, da se objekat koristi u svrhu za koju je izgrađen, kao i da je u zatečenom stanju bezbedan za boravak dece van i unutar objekta”(prilog 03)</p> <p>U izveštaju o kontrolisanju električnih instalacija niskog napona, izrađenom od strane REMONTNI CENTAR DOO UŽICE, zaključuje se da su prilikom kontrolisanja električnih instalacija niskog napona u objektu Osnovne škole “PETAR LEKOVIĆ”-izdvojene škole Zdravčiči, koji se nalazi u selu Zdravčiči, opština Požega, dobijeni rezultati merenja impedanse petlje kvara ZADOVOLJAVAJUĆI u smislu <i>Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona</i> (Sl. list SFRJ br. 53/88 i Sl. list SRJ br. 28/95.) član 193, 197, 197a, 197b i 197v) i prema standardu SRPS HD 60364-6:2017, i da su dobijeni rezultati merenja galvanske neprekidnosti zaštitnog provodnika i provodnika za izjednačenje potencijala ZADOVOLJAVAJUĆI u smislu <i>Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona</i> (Sl. list SFRJ br. 53/88 i Sl. list SRJ br. 28/95.) član 194.</p> <p>U objektu postoje aparati za gašenje požara, kao i info table i vidno označeni putevi evakuacije dece i zaposlenih za slučaj požara. Prostorije koje će se koristiti za potrebe predškolske ustanove, kao i ostale prostorije u objektu predmet su redovnih kontrola za proveru protivpožarnih mera.</p>
Geografski opis	<p>Objekat izdvojenog odeljenja O.Š. Petar Leković u Zdravčičima nalazi se u centralnom delu naselja Zdravčiči neposredno uz magistralu Zdravčički put. Objekat ima veliko ograđeno dvorište za aktivnosti sa decom i okružen je zelenilom, uglavnom šumarcima i oranicama. Objekat je priključen na gradski vodovod i kanalizaciju i ima sopstvenu kotlarnicu na pelet. U blizini nema značajnih zagađivača vazduha. Naselje Zdravčiči se nalazi na oko 5 km od centra Požege prema zapadu. U okolini objekta preovlađuju niske građevine i stambene kuće sa okućnicama, kao i oranice, baste, voćnjaci i šumarci, karakteristične za</p>

1. Deo: INSTITUCIONALNI I ADMINISTRATIVNI	
	ovaj tip naselja u opštini. U neposrednoj blizini se ne nalaze verski objekti, spomenici kulture ili prirode.
1. Deo: INSTITUCIONALNI I ADMINISTRATIVNI	
ZAKONODAVSTVO	
Utvrđite nacionalno i lokalno zakonodavstvo i dozvole koje se odnose na projektne aktivnosti	<p>U skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji , član 36a) “tekuće (redovno) održavanje objekta jeste izvođenje radova koji se preduzimaju radi sprečavanja oštećenja koja nastaju upotrebom objekta ili radi otklanjanja tih oštećenja, a sastoje se od pregleda, popravki i preduzimanja preventivnih i zaštitnih mera, odnosno svi radovi kojima se obezbeđuje održavanje objekta na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti, kao što su krećenje, farbanje, zamena obloga, zamena sanitarija, radijatora, zamena unutrašnje i spoljašnje stolarije i bravarije, zamena unutrašnjih instalacija i opreme bez povećanja kapaciteta i drugi slični radovi, ako se njima ne menja spoljni izgled zgrade i ako nemaju uticaj na zajedničke delove zgrade i njihovo korišćenje”</p> <p>Isti zakon kaže da za izvođenje radova na tekućem održavanju objekta nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa za gradnju, odnosno akt za izvođenje radova, te shodno tome nije potrebno vršiti prijavu radova.</p> <p>Ministarstvo zaštite životne sredine (MZŽS) predstavlja ključnu instituciju u Republici Srbiji odgovornu za stvaranje i sprovođenje politike zaštite životne sredine, dok Zakon o zaštiti životne sredine uređuje integralni sistem zaštite životne sredine kojim se obezbeđuje ostvarivanje prava čoveka na život i razvoj u zdravoj životnoj sredini i uravnotežen odnos privrednog razvoja i životne sredine u Republici Srbiji.</p> <p>Deo nadležnosti u oblasti integralnog sistema zaštite životne sredine imaju jedinice lokalne samouprave, između ostalog, sprovođenje procedure procene uticaja projekta na životnu sredinu upravo za one projekte za koje odobrenja za izgradnju izdaju organi lokalne samouprave.</p> <p>Shodno Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu “projekat jeste izvođenje građevinskih radova, ugradnja instalacija, postrojenja i opreme, njihova rekonstrukcija, uklanjanje i/ili promena tehnologije, tehnologije procesa rada, sirovine, repromaterijala, energenata i otpada, kao i ostale intervencije u prirodi i prirodnom okruženju uključujući radove koji obuhvataju eksploataciju mineralnih sirovina”.</p> <p>Prema Članu 3. istog Zakona, procena uticaja se vrši za projekte iz oblasti industrije, rudarstva, energetike, saobraćaja, turizma, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, upravljanje otpadom i komunalnih delatnosti, kao i za sve projekte koji se planiraju na zaštićenom prirodnom dobru i u zaštićenoj okolini nepokretnog kulturnog dobra. Vlada Republike Srbije propisuje Listu projekata za koje je obavezna procena uticaja (LISTA I) i Listu projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (LISTA II) („Sl. glasnik RS“, broj 84/2005).</p>

1. Deo: INSTITUCIONALNI I ADMINISTRATIVNI

Obzirom da za projekte ovog obima i aktivnosti nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa za gradnju, nije potrebno sprovesti proceduru procene uticaja na životnu sredinu.

Sa druge strane, činjenica da procedura nije obavezna, nikako ne isključuje poštovanje mera ublažavanja uticaja na životnu sredinu i socijalno okruženje koje su opisane u ovom planu.

U toku realizacije Projekta potrebno je pridržavati se i sledećih propisa:

- Zakon o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004, 36/09 i 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon i 43/2011. – odluka US, 14/2016, 76/18 i 95/18 – dr. zakon);
- Zakon o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010 i 91/2010 – ispr. 14/2016, 95/18 – dr. zakon);
- Zakon o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon i 9/2020);
- Zakon o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018, 87/2018 – dr. zakon);
- Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS” br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 – dr. zakon)
- Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova („Službeni glasnik SRS”, broj 53/97).
- Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti „Službeni glasnik RS“, broj 94 od 3. jula 2020.
- Zakon o predmetima opšte upotrebe ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)
- Pravilnik o uslovima za osnivanje ti rad predškolskih ustanova ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2019)
- Pravilnik o bezbednosti igračaka ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
- Pravilnik o utvrđivanju liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda ("Sl. glasnik RS", br. 20/2021) .
- Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010)
- Zakon o potvrđivanju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuska konvencija) („Službeni glasnik RS” br. 38/2009)

Mere zaštite prilikom postupanja sa otpadom sprovede se u skladu sa:

- Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/18 – dr. zakon);
- Pravilnikom o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada („Sl. glasnik RS“, broj 92/2010);
- Pravilnikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Sl. glasnik RS“, br. 56/10 i 93/2019);

1. Deo: INSTITUCIONALNI I ADMINISTRATIVNI

	<ul style="list-style-type: none">– Pravilnikom o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije („Sl. glasnik RS“, br. 98/2010) i– Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 95/2018 – dr. zakon).– Zaštita vazduha u skladu sa:– Zakonom o zaštiti vazduha („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009 i 10/2013);– Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Sl. glasnik RS“, br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013). <p>Mere za zaštitu od buke će biti preduzete u skladu sa sledećim propisima:</p> <ul style="list-style-type: none">– Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010);– Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini („Sl. glasnik RS“, br. 75/2010) i– Pravilnik o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke („Sl. glasnik RS“, br. 72/2010)
Da li su pribavljene sve potrebne dozvole?	<p>DA [X] NE []</p> <p>S obzirom da je objekat je sazidan pre rata, 1938. godine, pre donošenja propisa o izgradnji objekata bez građevinske dozvole ali je adaptirana 1990. godine. S obzirom da je objekat izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji objekata, za potrebe realizacije tekućeg održavanja dela škole, odnosno za potrebe PU „Olga Jovičić Rita“ Požega, angažovan je građevinski inspektor sa zadatkom sačinjavanja izveštaja. U predmetnom izveštaju građevinskog inspektora, Odeljenja za inspeksijske poslove – građevinska inspekcija, opštinske uprave Opštine požega, sačinjenom u martu 2022. godine, između ostalog, se navodi: “Da je objekat građen od čvrstog materijala (puna opeka u malteru), pokriven crepom preko drvene krovne konstrukcije i da je fasada malterisana i bojena fasadnom bojom, da je vizuelnim pregledom utvrđeno da na objektu nema oštećenja na zidovima i drugim konstruktivnim elementima koja bi ukazivala na nestabilnost konstrukcije objekta i nebezbednost istog za korišćenje, da nisu vidljivi ugibi u međuspratnoj konstrukciji i krovnoj konstrukciji kao i da nije došlo do sleganja tla ispod objekta. S obzirom na navedeno konstatuje se da statička stabilnost objekta nije ugrožena, da se objekat koristi u svrhu za koju je izgrađen, kao i da je u zatečenom stanju bezbedan za boravak dece van i unutar objekta”(prilog 03)</p> <p>U izveštaju o kontrolisanju električnih instalacija niskog napona, izrađenom od strane REMONTNI CENTAR DOO UŽICE, zaključuje se da su prilikom kontrolisanja električnih instalacija niskog napona u objektu Osnovne škole “PETAR LEKOVIC”-izdvojene škole Zdravčiči, koji se nalazi u selu Zdravčiči, opština Požega, dobijeni rezultati merenja impedanse petlje kvara ZADOVOLJAVAJUĆI u smislu <i>Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona</i> (Sl. list SFRJ br. 53/88 i Sl. list SRJ br. 28/95.) član 193, 197, 197a, 197b i 197v) i prema standardu SRPS HD 60364-6:2017, i da su dobijeni rezultati merenja galvanske neprekidnosti zaštitnog provodnika i provodnika za izjednačenje potencijala ZADOVOLJAVAJUĆI u</p>

1. Deo: INSTITUCIONALNI I ADMINISTRATIVNI

smislu *Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona* (Sl. list SFRJ br. 53/88 i Sl. list SRJ br. 28/95.) član 194.

JAVNE KONSULTACIJE

Opišite proces javnih konsultacija

Javne konsultacije o potprojektima izvođenja

Pre izvođenja radova organizovane su javne konsultacije sa zainteresovanim stranama sa ciljem prezentacije dokumentacije (predmer radova) za izvođenje radova na tekućem održavanju u opisanom projektu.

Javne konsultacije održane su u prostorijama predškolske ustanove i to:

- Opština Požega, 29.03. 2022. godine u prostorijama predškolske ustanove „Olga Jovičić Rita“ sa početkom u 16:00 h.

Obaveštenje o održavanju javnih konsultacija, bilo je istaknuto na oglasnoj tabli predškolske ustanove 10 dana pre održavanja sastanaka, ali je posredstvom Viber roditeljskih grupa i neposredno preko zaposlenih vaspitača, par dana pre sastanka, napravljen podsetnik. Odziv je bio dobar obzirom na uslove pandemije u vreme održavanja konsultacija.

Prisutni, uglavnom predstavnici roditelja, su upoznati sa projektom, načinom organizacije i funkcionisanja projekta, komponentama i odgovornim stranama za realizaciju Komponente 1. u okviru koje se sprovodi renoviranje i opremanje (tekuće održavanje) vaspitnih soba koje su predmet konsultacija. Svrha i cilj javnih konsultacija je predstavljanje planiranih budućih aktivnosti na uređenju navedenih prostorija u vrtićima, upoznavanje sa planiranim intervencijama, kako bi se ostvarila komunikacija sa lokalnom zajednicom. Cilj predstavljanja planiranih aktivnosti je mogućnost davanja primedbi i iznošenje komentara na planirane radove.

Zainteresovana javnost je upoznata sa procesom sprovođenja projekta. Predočeno im je da se za predmetni projekat izrađuje Kontrolna lista za upravljanje životnom sredinom i socijalnim pitanjima, kao i da će im ista biti dostupna na uvid na sajtu projekta. Pre izvođenja radova uprava vrtića će anketirati roditelje/staratelje o mogućnostima pauziranja dolaska dece, neće biti prisilne obustave dolaska. Blagovremeno će biti obavešteni, odnosno već su obavešteni o planiranim radovima tokom javnih konsultacija. Predškolska ustanova će organizovati rad tako da deca nesmetano dolaze.

Svi zainteresovani su izrazili želju da se sa radovima otpočne što pre i ukazali na veliki značaj projekta za lokalnu zajednicu. Takođe su pokazali veliku spremnost da dolasci dece u ustanovu budu redukovani tokom trajanja radova, ukoliko postoji potreba.

Prisutni su upoznati sa načinom funkcionisanja žalbenog mehanizma. Tokom javnih konsultacija ponuđen im je odštampani formular za upućivanje žalbi i upućeni su na web sajt projekta: <https://ecec.mpn.gov.rs/> sa naznakom da je žalbeni mehanizam kreiran tako da su prijave anonimne, kao i da se žalbe mogu uputiti tokom ukupnog trajanja izvođenja radova, kao i tokom celog procesa realizacije projekta.

1. Deo: INSTITUCIONALNI I ADMINISTRATIVNI	
	<p>Zapisnik o održanim konsultacijama sadrži listu prisutnih i biće sastavni deo izveštaja o sprovedenom PzUŽSSO.</p> <p>Javne konsultacije o kontrolnoj listi za PzUŽSSO se ne sprovode, ali se ista objavljuje na sajtu Projekta i zainteresovanoj javnosti se ostavlja mogućnost davanja komentara i sugestija u trajanju od deset dana. Kontrolna lista ostaje javno dostupna do kraja projekta (http://www.mpn.gov.rs/ipvo-ecec/)</p>
TRENINZI ZA PODIZANJE NIVOA SVESTI	
Opišite trening za podizanje svesti za decu, školsko osoblje i nastavnike	<p>Tokom izvođenja radova na realizaciji projekta korišćenje objekta je organizovano tako da će deca i zaposleno osoblje biti izmešteno u centralni objekat u Požegi. Obzirom na obim radova pretpostavka je da će isti biti završeni u roku od nekoliko nedelja.</p> <p>Tokom izvođenja radova na realizaciji projekta korišćenje objekta je organizovano tako da objekat neće biti u funkciji predškolske ustanove, odnosno u objektu neće boraviti deca a ni zaposleno osoblje.</p>
MEHANIZAM PODNOŠENJA ŽALBI	
Opis žalbenog mehanizma	<p>Tokom javnih konsultacija, koje su održane pre izvođenja radova, zainteresovane strane su upoznate sa mogućnostima podnošenja žalbi i načinom podnošenja žalbi u svim fazama realizacije projekta.</p> <p>Za potrebe ovog projekta osmišljen je Žalbeni mehanizam. Imajući u vidu vrstu potencijalnih uticaja Projekta, postoji i centralni žalbeni mehanizam za Projekat, tj. Centralni pult za pružanje povratnih informacija, na nivou subjekta koji sprovodi projekat u okviru MPNTR.</p> <p>Svaki pojedinac koji se oseća ugroženim ili oštećenim zbog neke od konkretnih aktivnosti projekta „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ može podneti žalbu. Žalbe mogu podneti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – građani koji smatraju da su oštećeni zbog građevinskih radova u okviru projekta (raseljavanje iz prostorija u kojima se realizuju građevinski radovi, nerešena imovinska pitanja, otkup zemljišta, eksproprijacija, uticaj na životnu sredinu, neodgovarajuća bezbednost tokom radova i slično); – građani na koje aktivnosti projekta u lokalnoj sredini utiču na bilo koji način za koji smatraju da ih ugrožava (neprimereno ponašanje zaposlenih na projektu i izvođača radova, ugrožena prava, nepoštavanje pravednosti i slično). <p>Žalba se podnosi popunjavanjem žalbenog formulara i to na jedan od sledećih načina:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Popunjavanjem elektronskog formulara, koji je zainteresovanoj javnosti dostupan na web stranici projekta https://ecec.mpn.gov.rs/ 2) Popunjavanjem formulara u Word-u, koji će zainteresovanoj javnosti biti dostupan u prostorijama uprave predškolske uprave u štampanom obliku i naknadnim slanjem na dva načina: <ul style="list-style-type: none"> – Elektronski na adresu ecec@mpn.gov.rs – Odštampan na adresu:

1. Deo: INSTITUCIONALNI I ADMINISTRATIVNI

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

za projekat „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje “

Nemanjina 22-26

11000 Beograd

Žalbeni formular prikazan je u prilogu 04 ovog dokumenta.

Centralni pult će služiti i kao informativni centar i kao žalbeni mehanizam u okviru Projekta, i biće dostupan svim stranama pogođenim sprovođenjem svih potkomponenti Projekta. On će se primenjivati na sve projektne aktivnosti i relevantan je za sve lokalne zajednice na koje projektne aktivnosti sprovedene u okviru pojedinačnih segmenata imaju uticaja.

Centralni pult će biti odgovoran za prikupljanje i rešavanje žalbi i komentara sledeće grupe subjekata:

- Stanovnici zainteresovani za Projekat, odnosno oni koji su pogođeni projektom, koji stanuju na teritoriji opštine;
- Roditelji/staratelji dece koja pohađaju ili će pohađati predškolske ustanove;
- Zaposleni u predškolskim ustanovama;
- Angažovani na realizaciji projekta;
- Druga zainteresovana javnost.

Centralni pult je oformljen na vreme, kako bi se na adekvatan način upravljalo žalbama i odgovorilo na žalbe stanovništva iz područja uticaja Projekta primljenih u različitim fazama projekta. Takođe će biti odobren prijem žalbi u vezi sa izgradnjom, funkcionisanjem i zatvaranjem potprojekta. Uz to, ova procedura će pomoći u unapređenju društvenog učinka Projekta, pošto su broj i priroda primljenih primedbi pokazatelj načina na koji se Projekat sprovodi, kao i ponašanja zaposlenih i izvođača.

MPNTR će se postarati da u potpunosti informiše osobe pogođene projektom o žalbenom mehanizmu tako što će ih obavestiti o postojanju i ulozi Centralnog pulta, njegovoj funkciji, osobama za kontakt i procedurama za podnošenje žalbi u pogođenim područjima. Informacije o Centralnom pultu biće dostupne:

- na sajtu MPNTR (www.mpn.gov.rs, <http://www.mpn.gov.rs/ipvo-ecec/>)
- u prostorijama uprave predškolske ustanove i
- na oglasnim tablama vrtića

DEO 2: Ekološka i socijalna procena

DEO 2: EKOLOŠKA I SOCIJALNA PROCENA			
Da li će aktivnost na odabranoj lokaciji uključivati / uključivati bilo šta od sledećeg	Aktivnost / izdanje	Status	Dodatne reference
	A. Opšti uslovi	[X] DA [] NE	Pogledajte odeljak A
	B. Renoviranje zgrade / opremanje	[X] DA [] NE	Pogledajte odeljak A, B , u nastavku
	C. Nameštaj i opremanje	[X] DA [] NE	Pogledajte odeljak A, B, C u nastavku
	D. Istorijske zgrade i kulturne celine	[] DA [] NE [X] MOŽDA	Pogledajte odeljak D u nastavku
	E. Bezbednost saobraćaja i pešaka	[X] DA [] NE	Pogledajte odeljak E u nastavku
	F. Socijalna zdravstvena i pitanja bezbednosti	[X] DA [] NE	Pogledajte odeljak A, F, G i H u nastavku
	G. Izmeštanje dece u druge škole i ustanove tokom građevinskih radova	[X] DA [] NE	Pogledajte odeljak A, F, G i H u nastavku
AKTIVNOST	PARAMETAR	KONTROLNA LISTA MERA UBLAŽAVANJA	
A Opšti uslovi	Obaveštenje, bezbednost u zajednici i bezbednost i zdravlje na radu za radnike	<ol style="list-style-type: none"> 1. Javnost je obaveštena o radovima putem odgovarajućeg obaveštenja na vidnom mestu na ulazu u objekat, odnosno dvorište (mesto radova). Sve relevantne nadležne institucije obaveštene su o početku radova, uključujući i inspekcije; 2. Plan zaštite na radu, Plan upravljanja otpadom biće pripremljeni pre radova; 3. Sav posao obavljaće se na bezbedan i disciplinovan način, organizovan tako da spreči nezgode i akcidente, te umanjiti uticaj na radnike, susedne stanovnike i životnu sredinu; 4. Svi radovi moraju biti izvedeni tako da budu sigurni za decu i zaposlene u vrtiću. (Prioritetno jasno obeleženim putanjama za kretanje radnika i jasno postavljenim znacima zabrane ulaska u prostorije koje se adaptiraju za sva nezaposlena lica tokom vremena trajanja radova). 	

DEO 2: EKOLOŠKA I SOCIJALNA PROCENA

5. Zaštitna oprema za radnike zadovoljava standard međunarodne dobre prakse, korišćiće se u svakom trenutku (uvek zaštitne kape, prsluci, po potrebi maske, rukavice i zaštitne naočare i zaštitna obuća);
6. Odgovarajuća obaveštenja na lokaciji informisaće radnike o ključnim pravilima i propisima kojih se moraju pridržavati;
7. Svi radnici moraju biti obučeni i sa iskustvom za izvođenje dodeljenih zadataka/radova;
8. Svi koji rade sa strujom, visokim-naponom, na visinama, s kemikalijama, itd. moraju postupati vrlo oprezno, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i sigurnosnim standardima I najboljim praksama. Takvi se poslovi se obavljaju od strane adekvatno obučeni i sertifikovanih radnika za rad sa rizikom;
9. Ako se dogodi incident ili nesreća sa ozbiljnim negativnim uticajem ili posledicama po životnu sredinu i / ili zdravlje ljudi, Jedinica za implementaciju projekta (PIU) treba biti obavještena bez odlaganja. PIU će obavestiti Svetsku banku u roku od 48 sati od incidenta. Obaveštenje će sadržati sve dostupne informacije o događaju. Detaljnija analiza (analiza uzroka) biće sprovedena u dogovorenom roku;
10. Oprema za bezbednost i zdravlje na radu za radnike mora biti dostupna na lokaciji (prva pomoć, zaštitna odeća za radnike, odgovarajuće mašine i alati, protivpožarna oprema, itd.);
11. Izvođač radova mora biti upoznat sa važećim Planom evakuacije i spašavanja za objekat u kome izvodi radove pre početka radova i mora se pridržavati propisanih mera Svi radnici moraju biti upoznati sa opasnostima od požara i merama zaštite od požara i moraju biti obučeni za rukovanje aparatima za gašenje požara, hidrantima i drugim uređajima koji se koriste za gašenje požara;
12. Radnici moraju redovno održavati lokaciju projekta urednom, redovno uklanjati prekomerni otpad i ostatke tečnosti;
13. Veće količine zapaljivih tečnosti ne treba držati na lokaciji;
14. Svi angažovani radnici na ovom projektu moraju imati regulisan radni status od strane dobavljača / podizvođača i moraju imati puno zdravstveno i penzijsko osiguranje, a sve u skladu sa lokalnim zakonodavstvom o radu i međunarodnim standardima rada.
15. Svi opasni delovi površina pod radovima, moraju se adekvatno oznaciti i ograditi radi sprečavanja ozleda.
16. Korisnik objekta obavezan je izraditi (ili ažurirati postojeće) Plan održavanja i sigurnosnih provjera objekta i opreme te Plan evakuacije i spašavanja pre završetka radova.

DEO 2: EKOLOŠKA I SOCIJALNA PROCENA

		<p>17. Postavljeni uređjaji za klimatizaciju i ostala elektronska oprema su najmanje B razreda energetske efikasnosti.</p> <p>18. Kod špricanja boja i sl. tekućih agensa radnici moraju nositi minimalno FFP2 maske. Antokorozivna zaštita neće se obavljati na lokaciji.</p> <p>19. Svako namjerno uništavanje zelenila i travnatih površina je strogo zabranjeno. U slučaju nenamjernog oštećenja ili uništavanja zelenila isto će se vratiti u prvobitno stanje (ozeleniti).</p>
B. Aktivnosti renoviranja i opremanja	Kvalitet vazduha	<p>1. Suzbijanje prašine tokom unutrašnjih radova povremenim prskanjem vode</p> <p>2. Da bi se smanjila prašina, građevinski materijal treba na odgovarajući način čuvati i pokriti;</p> <p>3. Obavezno korišćenje zaštitnih maski za radnike ako se stvara prašina tokom radova;</p> <p>4. Održavanje pristupa objektu čistim da se prašina ne raznosi</p> <p>5. U blizini objekta neće biti prekomernog praznog hoda građevinskih i drugih vozila, kao ni vozila koja dovoze i odvoze potrebni material i radnike.</p> <p>6. Za izbacivanje šuta s visine iznad prvog sprata, upotrijebljivati cevi za spuštanje.</p>
	Buka	<p>1. Građevinska buka će biti ograničena zakonom dozvoljen nivo za naseljeno mesto.</p> <p>2. Ne treba dozvoliti izvođenje građevinskih radova noću, aktivnosti na gradilištu treba ograničiti na period od 7 h do 19 h. Imajući u vidu gorepomenute mere za bezbednost i zdravlje na radu, raspored se eventualno može promeniti u skladu sa posebnim odobrenjem koje izdaje relevantni organ.</p> <p>3. Radovi će biti organizovani na način da se radovi za koje se zna da proizvode povećani nivo buke planiraju u skladu sa radnim vremenom gradilišta.</p> <p>4. Nivo buke će se održavati na nivou koji ne ometa susede, decu i zaposlene vrtića. Ukoliko bude pritužbi na buku ili prasinu, obavice se dodatna mjerenja i uvesti dodatne mere, npr. panoi za zaštitu od buke i prasine, i sl.</p> <p>5. Neće biti radova nocu, osim uz ishodovanje dozvola nadležnih tela. Svi bučniji radovi, obavljat će se isključivo danju.</p> <p>6. Radovi koji rezultiraju povišenim razinama buke se neće obavljati tokom boravka dece u vrticu.</p>
	Upravljanje otpadom	<p>1. Tokom aktivnosti u objektu dolaziće do generisanja građevinskog i komunalnog otpada (usled boravka radnika) kojim će se upravljati na način koji propisuje Zakon o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon) i drugi akti koji proističu iz Zakona;</p>

DEO 2: EKOLOŠKA I SOCIJALNA PROCENA

		<ol style="list-style-type: none">2. Kad god je to moguće, izvođač će ponovo koristiti i reciklirati odgovarajuće i održive materijale (osim azbesta);3. Prilikom dopremanja nameštaja do objekta doći će do stvaranja ambalažnog otpada. U postupanju sa ambalažnim otpadom posebno su važne odredbe Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 95/2018 – dr. zakon) koje predviđaju da se komunalni ambalažni otpad sakuplja sa određene teritorijalne celine u skladu sa zakonom;4. Drugi generisani otpad tokom izgradnje i eksploatacije projekta biće tretirani u skladu sa važećom regulativom a na način da ne izazivaju efekte na životnu sredinu;5. Opasni otpad drži se u neporopousnim kontejnerima i ne mijesa se.6. Dodeliti prostor ispred i unutar objekta za privremeno skladištenje građevinskog materijala i otpada tako da slobodno kretanje ne bude ometano;7. Sav otpad, uključujući građevinski i opasni otpad sakupljaće se i odlagati u licenciranim objektima, od strane ovlašćenih sakupljača;8. Treba voditi evidenciju o nastalom, sakupljenom i prevezenom otpadu;9. Otpad treba pokriti tokom transporta;10. Spaljivanje otpada na lokaciji ili negde drugde (osim ako nisu licencirane spalionice) je zabranjeno;11. Nakon završetka radova, sav otpad će biti uklonjen sa lokacije;12. Ukoliko se na lokaciji detektuje prisustvo azbesta ili drugog otpada koji se definiše kao opasan otpad potrebno je zbrinuti ga posredstvom licenciranog upravljača za određenu vrstu otpada.13. U slučaju otkrivanja azbesta na postojećem objektu, razviti Plan/proceduru za upravljanje azbestom u skladu sa zakonskom regulativom i najboljim praksama, prihvatljiv JUP i SB.14. Primeniti sve mere za zaštitu zdravlja i bezbednosti zaposlenih u skladu sa planom/procedurom za upravljanje azbestom.15. Radove na rušenju ili uklanjanju azbesta mora da obavlja lice koje je u skladu sa propisom o upravljanju otpadom dobio odgovarajuću dozvolu za upravljanje otpadom koji sadrži azbest.
Transport i upravljanje materijalima		<ol style="list-style-type: none">1. Sav materijal sklon prašini prevozi se u zatvorenim ili pokrivenim kamionima;2. Svi materijali skloni prašini i osetljivi na vremenske uslove zaštićeni su od atmosferskih uticaja bilo vetrobranskim staklima, prekrivačima, vodom ili drugim odgovarajućim sredstvima;

DEO 2: EKOLOŠKA I SOCIJALNA PROCENA

AKTIVNOST	PARAMETAR	KONTROLNA LISTA MERA UBLAŽAVANJA
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Prosuti materijali se odmah uklanjaju sa koloseka i čiste. Sva polovna vozila i mašine su atestirani i dobro održavani; 4. Pristup vozilima za isporuku materijala strogo se kontroliše, posebno tokom vlažnog vremena; 5. Neće se koristiti nelicencirane kamenolomi ili deponije otpada. 6. Upravljanje hemikalijama obavljaće se u skladu sa bezbedonosnim listovima proizvođača, zakonom i najboljim praksama. Njima će upravljati osobe koje su za to obučene. 7. Hemikalije se nabavljaju samo od registrovanih proizvođača i njihovih zastupnika 8. Sav material mora biti izvoran, ne recikliran niti već korišćen; 9. Mineralni materijali (kamen, pesak, šljunak i sl.) nabavljaju se isključivo od dobavljača koji poseduju sve odgovarajuće dozvole. 10. Koristit će se isključivo neopasne boje i lakovi. 11. Upotrebljavat će se isključivo materijali otporni na gorenje; 12. Nabavljeni nameštaj (uključujući i maske za radijatore) je siguran za decu i instaliran je na siguran način. Korišćeni materijali moraju biti neopasni za zadržavlje dece i odraslih.
C. Nameštaj i opremanje		<ol style="list-style-type: none"> 1. Nameštaj dopremiti nakon prethodno očišćenih prostorija 2. Otpad generisan prilikom otpakivanja i montaže nameštaja zbrinuti na zakonom predviđena mesta 3. Karton predati na punktu za reciklažu 4. Nabavljaju se igračke i oprema provereno sigurna za decu (u materijalu, obliku i drugim karakteristikama) prema važećim nacionalnim zakonima i standardima. 5. Sprovodi se plan redovnog čišćenja i dezinfekcije opreme u skladu sa uslovima COVID-19. 6. Korisnik je obavezan pripremiti i sprovoditi Plan sigurnosti i održavanja opreme (uključujući nameštaj) i igračkaka. 7. Sva oprema, spoljašnja i unutrašnja, se redovno održava i kontroliše kako bi se osugarala bezbednost korisnika. 8. Sva oprema vrtića mora biti proizvedena i instalirana tako da bude sigurna za decu.

DEO 2: EKOLOŠKA I SOCIJALNA PROCENA

D. Istorijske zgrade i kulturne celine		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pribaviti Saglasnost nadležnog Zavoda za zaštitu spomenika kulture 2. Tokom izvođenja radova pridržavati se opštih uslova zaštite objekta i eventualnih propisanih mera na koje ukazuje Zavod. 3. U slučaju pronalaska arheoloških i/ili kulturnih nalazaka, radove je potrebno odmah prekinuti te obavestiti to nadležno telo (npr. Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda). Radovi se mogu nastaviti kada nadležno telo za to izda odobrenje.
AKTIVNOST	PARAMETAR	KONTROLNA LISTA MERA UBLAŽAVANJA
E. Bezbednost saobraćaja i pešaka	Direktne ili indirektne opasnosti za javni saobraćaj i pešake zbog projektnih aktivnosti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prilagoditi radno vreme lokalnim obrascima saobraćaja, npr. izbegavajti veće transportne aktivnosti u vreme saobraćajnog špica; 2. Aktivno upravljati saobraćajem ako je to potrebno za siguran i pogodan prolaz za javnost prilikom dopremnja materijala i opreme na lokaciju; 3. Postaviti znakove upozorenja/putokaze tako da gradilište bude jasno vidljivo, a javnost upozorena na sve potencijalne opasnosti
F. Socijalna i zdravstvena i bezbednosna pitanja	Zaštita ljudskog zdravlja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obezbediti na lokaciji kontakt osobe koje su zadužene za komunikaciju i prijem zahteva / žalbi od lokalnog stanovništva na na nivou lokacije objekta; 2. Ako je lokacija naseljena, zabranite građevinske aktivnosti noću. 3. Pravilno obeležiti objekat (tablu sa osnovnim podacima o potprojektu, uključujući i dostupnost žalbenih mehanizama) sprečavajući ulazak i izlazak nezaposlenih u objekat da se mešaju i komuniciraju sa radnicima. 4. Za građevinske radnike – potrebna je primena zakonski propisanih zdravstvenih i bezbednosnih mera: <ol style="list-style-type: none"> a) korišćenje odgovarajuće zaštitne odeće i opreme (maske protiv prašine, iverja i drvenih vlakana, šlemovi, kao i sigurnosni pojasevi za rad na visini, itd.); i druga oprema za rad u skladu sa potrebama; b) održavanje dobrog nivoa lične higijene; v) zdravstvena zaštita – obezbeđivanje kompleta prve pomoći i lica obučeni za pružanje prve pomoći na gradilištu tokom izvođenja radova; 5. Adekvatne protivpožarne mere su provedene i oprema je dostupna . 6. Svi radnici su prošli adekvatnu obuku. 7. Procedure i planovi su predstavljeni i dostupni zaposlenima. 8. Znakovi opasnosti i obaveznog nošenja opreme su postavljeni na vidljiva mjesta. 9. Pristup gradilištu je jasno označen.

DEO 2: EKOLOŠKA I SOCIJALNA PROCENA

		<ol style="list-style-type: none">10. Opasni delovi gradilišta su jasno ozačeni i ograđen.11. Svi objekti moraju da imaju važeći Plan evakuacije i spasavanja. Po potrebi plan će se ažurirati.12. Vrtić zadovoljava sve protivpožarne nacionalne zakone i standarde.13. Izvršiti sve neophodne radnje i provere da se osigura da je objekat nakon izvođenja radova siguran za upotrebu.
G. Izmeštanje dece u druge škole i ustanove tokom građevinskih radova		<ol style="list-style-type: none">1. Proceniti fizičke kapacitete objekata (prostora) domaćina koji prima decu iz objekta u kome se izvode radovi.2. Komunicirajte sa objektima domaćina i rano najavite mogući priliv dece.3. Poboljšati komunikaciju među različitim starosnim grupama unutar klastera domaćina i preraspoređene dece.4. Uverite se da sanitarni i higijenski uslovi u objektima za privremeno izmeštanje mogu podržati priliv dece usled drugačije organizacije rada.5. Nevoljno premeštanje treba izbegavati tamo gde je to moguće ili minimizirati, istražujući sve održive alternativne. Uvidom u pripremljena obaveštenja za roditelje/staratelje.6. Osigurati mogućnost korišćenja pre početka građevinskih radova, kako bi se osigurala potpuna usklađenost s propisima Republike Srbije i zajmodavca i osigurala puna primena PzUŽSSO od strane Korisnika i obezbedila efikasna povezanost PzUŽSSO s drugim dokumentima ugovora.
G. Izbijanje i širenje virusa COVID-19		<ol style="list-style-type: none">1. Organizovati radove tako da se maksimalno izbegava grupisanje radnika na malom prostoru.2. Održavati potrebnu distancu (2m).3. Obezbediti lična zaštitna sredstva za radnike u skladu sa propisanim merama (maske i rukavice).4. Obezbediti tekuću čistu vodu na gradilištu, sapune i dezinfekciona sredstva.5. Obezbediti dovoljan broj kanti za smeće i redovno ih prazniti.6. Jasno odvojiti komunikacione linije koje koriste radnici i korisnici objekta kako ne bi dolazilo do kontakta.7. Primeniti sve mere iz plana za bezbednost i zdravlje vezano za izbijanje i širenje virusa COVID-19.

DEO 2: EKOLOŠKA I SOCIJALNA PROCENA		
		8. Uskladiti procedure sa zahtevima nacionalnih institucija i preporukama Svetske zdravstvene organizacije.

DEO 3: Plan monitoringa

DEO 3: PLAN MONITORINGA							
Faza	Koji se parametar prati?	Gde?	Kako će se pratiti parametar?	Kada će se pratiti parametar (učestalost merenja)?	Zašto će se pratiti parametar?	Trošak	Odgovornost
FAZA PRIPREMANJA PREDMERA I PREDRAČUNA							
	Uključivanje odredbi PzUŽSSO u ugovore Status potrebnih dozvola i planova (Plan organizacije gradilišta, Plan za upravljanje otpadom Imenovana osoba za prijem žalbi, Plan za zaštitu bezbednosti i zdravlja na radu).	Na lokaciji Investitora i Izvođača	Pregled neophodnih dozvola, planova i ugovora sa Izvođačima	Pre početka građevinskih radova	Kako bi se osigurala potpuna usklađenost s propisima Republike Srbije i zajmodavca. Kako bi se osigurala puna primena PzUŽSSO od strane Izvođača i obezbedila efikasna povezanost PzUŽSSO s drugim dokumentima ugovora.	Nema	Izvođač Stručni nadzor Investitor JUP
	Blagovremeno obavestiti roditelje/staratelje o tačnom datumu premeštanja dece i vremenu trajanja izmenjenog	Na lokaciji objekta	Uvidom u pripremljena obaveštenja za roditelje/staratelje. Osigurati mogućnost korišćenja	Pre početka građevinskih radova	Kako bi se osigurala puna primena PzUŽSSO od strane korisnika i obezbedila efikasna povezanost PzUŽSSO s drugim dokumentima ugovora.	Nema	Stručni nadzor Investitor JUP Korisnik

DEO 3: PLAN MONITORINGA

Faza	Koji se parametar prati?	Gde?	Kako će se pratiti parametar?	Kada će se pratiti parametar (učestalost merenja)?	Zašto će se pratiti parametar?	Trošak	Odgovornost
	rasporeda, kao i o uslovima tokom izmenjenog rasporeda		žalbenog mehanizma				
Dizajn	Vatrootpornost i bezbednost korišćenih materijala	Tehnička dokumentacija	Pregledom tehničkih specifikacija	Pre početka radova	Osiguradnje dugoročne bezbednosti dece i zaposlenih u vrtiću i školi		Izvođač Stručni nadzor JUP
FAZA RENOVIRANJA							
	Uspostavljanje i sprovođenje odgovarajućih procedura, urednost, organizacija i bezbednost gradilišta,	Na lokaciji objekta	Provera planova i ugovora sa Izvođačima	Pre početka građevinskih radova	Kako bi se na najmanju meru smanjio rizik od nepovoljnih uticaja na životnu sredinu, bezbednost i zdravlje na radu usled nepostojanja ili nepoštovanja relevantnih procedura.	Nema	Izvođač Stručni nadzor JUP
Obezbeđivanje građevinskog materijala	Nabavka građevinskog materijala od licenciranih dobavljača / dobavljača	Kancelarija ili skladište izvođača	Verifikacija dokumenata	Tokom zaključenja ugovora o izvođenju radova	Osigurati pouzdanost građevinskih materijala i njihovu sigurnost za zdravlje ljudi		Izvođač Stručni nadzor JUP
	Plan za upravljanje otpadom za sve	Na lokaciji objekta	Vizuelna provera, Provera dokumentacije –	Pre početka radova	Kako bi se smanjila proizvodnja otpada i		Izvođač Stručni nadzor

DEO 3: PLAN MONITORINGA

Faza	Koji se parametar prati?	Gde?	Kako će se pratiti parametar?	Kada će se pratiti parametar (učestalost merenja)?	Zašto će se pratiti parametar?	Trošak	Odgovornost
	proizvedene tokove otpada;		Plan za upravljanje otpadom, licence odlagališta i prevoznika, dokumenti o kretanju otpada (količine, vrste, itd.)		obezbedio odgovarajući način odlaganja otpada.		Gradski službenici: komunalni inspektor i inspektor za zaštitu životne sredine
	Primenjeni propisi za bezbednost zajednice i mere zaštite definisane Planom	Lokacija objekta	Vizuelne provere	Na početku radova i svakog radnog dana do završetka radova	Kako bi se smanjili zdravstveni i bezbednosni rizici – povrede članova lokalne zajednice		Izvođač Stručni nadzor
	Plan za upravljanje otpadom za sve proizvedene tokove otpada	Na lokaciji objekta	Vizuelna provera, Provera dokumentacije – Plan za upravljanje otpadom, licence odlagališta i prevoznika, dokumenti o kretanju otpada ukoliko generisani otpad to zahteva	Pre početka radova	Kako bi se smanjila proizvodnja otpada i obezbedio odgovarajući način odlaganja otpada.		Izvođač Stručni nadzor

DEO 3: PLAN MONITORINGA

Faza	Koji se parametar prati?	Gde?	Kako će se pratiti parametar?	Kada će se pratiti parametar (učestalost merenja)?	Zašto će se pratiti parametar?	Trošak	Odgovornost
			(količine, vrste, itd.)				
	Plan evakuacije i spasavanja korisnika; Plan održavanja i sigurnosti	U objektu	Vizuelne provere	Prije završetka radova	Sigurnost dece	Trošak korisnika	Korisnik, JUP
	Plan evakuacije ispasavanja tokom radova	U objektu/uredu Izvođača	Vizuelne provere	Prije pocetka radova	Sigurnost zaposlenika	Uključen u trošak projekta	Izvođač Stručni nadzor
	Prisustvo građevinskog otpada (naročito stakla) i prašine nastalih tokom renoviranja Proizvodnja različitih vrsta otpada	U objektu	Vizuelne provere	Za lomljeno staklo odmah / za prašinu svakodnevno po završetku radova, za inertni otpad na svaka dva dana (zavisno od količine generisanog otpada)	Kako bi se izbegle i smanjile na najmanju meru povrede i udisanje prašine.		Izvođač Stručni nadzor
	Nivo prašine – fine čestice	Na lokaciji objekta	Vizuelne provere i instrumenti za merenje po potrebi; merenje nakon negativnog	Samo tokom renoviranja, periodično (u špicu rada)	Kako bi se izbeglo i smanjilo na najmanju meru nakupljanje prašine u vazduhu i smanjili rizici		Izvođač Stručni nadzor

DEO 3: PLAN MONITORINGA

Faza	Koji se parametar prati?	Gde?	Kako će se pratiti parametar?	Kada će se pratiti parametar (učestalost merenja)?	Zašto će se pratiti parametar?	Trošak	Odgovornost
			nalaza inspekcije ili pristigle žalbe lokalnog stanovništva		po zdravlje radnika i okolnog stanovništva.		
	Prikupljanje, prevoz i skladištenje opasnog otpada (ukoliko ga ima)	Na lokaciji objekta	Vizuelne provere i instrumenti za merenje po potrebi; merenje nakon negativnog nalaza inspekcije ili pristigle žalbe lokalnog stanovništva	Samo tokom renoviranja, periodično (u špicu rada)	Kako bi se izbeglo i smanjilo na najmanju meru nakupljanje prašine u vazduhu i smanjili rizici po zdravlje radnika i okolnog stanovništva.		Izvođač Stručni nadzor Licencirani operater
	Buka od građevinskih radova	Na lokaciji objekta	Auditivno praćenje nivoa buke i beleženje žalbi lokalnog stanovništva. U slučaju žalbi uvesti svakodnevno merenje buke u prostorijama vrtića	Redovno tokom radova, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom	Kako bi se pratilo da li su nivoi buke iznad ili ispod praga prihvatljivosti za to konkretno područje.		Izvođač Stručni nadzor
	Broj primljenih žalbi u vezi sa povišenom bukom,	Kroz registar žalbi	Kroz registar žalbi	Kontinuirano	Kako bi se blagovremeno identifikovali eventualni nedostaci u usvojenim merama za suzbijanje		MPNTR Izvođač Stručni nadzor

DEO 3: PLAN MONITORINGA

Faza	Koji se parametar prati?	Gde?	Kako će se pratiti parametar?	Kada će se pratiti parametar (učestalost merenja)?	Zašto će se pratiti parametar?	Trošak	Odgovornost
	vibracijama i prašinom				povišene buke, vibracija i prašine		
	Broj primljenih žalbi u vezi sa pristupom predškolskoj ustanovi i bezbednošću saobraćaja	Kroz registar žalbi	Kroz registar žalbi	Kontinuirano	Kako bi se blagovremeno identifikovali eventualni nedostaci u usvojenim merama za bezbednost saobraćaja		MPNTR Izvođač Stručni nadzor
Zdravlje i bezbednost	Snabdevanje građevinskih radnika radnom odećom i ličnom zaštitnom opremom (LZO); Strogo poštovanje pravila rada građevinske opreme i upotrebe OZO Pridržavanje svih zakonom propisanih mera zdravlja i bezbednosti na radu	Objekat u kome se vrše aktivnosti rekonstrukcije (tekuće održavanje)	Inspekcija aktivnosti	Čitav period izvođenja radova	Smanjiti verovatnoću traume i nezgoda za radnike	Nema posebnih dodatnih troškova:	izvođač radova

DEO 3: PLAN MONITORINGA							
Faza	Koji se parametar prati?	Gde?	Kako će se pratiti parametar?	Kada će se pratiti parametar (učestalost merenja)?	Zašto će se pratiti parametar?	Trošak	Odgovornost
	Pridržavanje svih mera i preporuka za sprečavanje širenja virusa COVID 19						
FAZA KORIŠĆENJA OBJEKTA							
	Plan za redovno i preventivno održavanje objekata	Pre početka rada objekta i tokom koriscenja objekta	Pregled plana	Na početku rada objekta i tokom koriscenja objekta	Kako bi se korisnicima objekta obezbedilo bezbedno radno okruženje rizici po zdravlje sveli na najmanju moguću meru	tekući	Osoblje predškolskog objekta Gradski službenici: komunalni inspektor i inspektor za zaštitu životne sredine
	Bezbednost – Plan nabavke i sigurnosnih specifikacija, Plan čišćenja i dezinfekcije, Plan održavanja prostorija, igrališta i opreme	Pregled dokumentacije i u objektu	Pregled plana nabavke i sigurnosnih specifikacija opreme u slučaju inspekcije. Redovna provera sigurnosti i održavanje unutrašnjih i spoljašnjih prostora; Plan čišćenja i	Na početku rada objekta i periodično	Zaštita zdravlja korisnika i zaposlenih		Osoblje predškolskog objekta Gradski službenici: komunalni inspektor

DEO 3: PLAN MONITORINGA

Faza	Koji se parametar prati?	Gde?	Kako će se pratiti parametar?	Kada će se pratiti parametar (učestalost merenja)?	Zašto će se pratiti parametar?	Trošak	Odgovornost
			dezinfekcije opreme redovno i u skladu sa uslovima propisanim za slučaj širenja virusa COVID-19				
Plan reagovanja u hitnim situacijama uključujući i reagovanje u slučaju požara	Mere protivpožarne zaštite - sistem za dojavu požara, za lokalizaciju požara, panik lampe, postojanje rezervnog sigurnosnog sistema za napajanje prostorija, obuka zaposlenih.	U objektu	Na početku rada i periodično	Tokom rada objekta	Smanjiti rizik po decu i zaposlene		Osoblje predškolskog objekta; Gradska služba – ovlašćena institucija

Procena uticaja –renoviranje i opremanje postojećeg objekta									
Životna sredina	Vrsta uticaja	Pozitivan ili negativan	Jačina uticaja	Domet/ lokacija javljanja uticaja	Vreme javljanja utica	Trajanje uticaja	Povratan/ nepovratan uticaj	Verovatnoća uticaja	Značaj
Otpad (očekuju se manje količine građevinskog i ambalažnog otpada,	uticaji na životnu sredinu i zdravlje usled neodgovarajućeg upravljanja različitim vrstama otpada	negativan	lokalan	na lokaciji nastanka i odlaganja	u fazi izgradnje	kratkoročan	nepovratan/ povratan	umerena	umeren
Buka i vibracije	buka izazvana izvođenjem građevinskih radova i prevozom i vibracije vozila za prevoz građevinskog materijala, prevoz radnika i prevoz otpada	negativan	lokalan	na lokaciji	u fazi izgradnje	kratkoročan	povratan	mala	mali
Bezbednost i zdravlje na radu	Uticaj na život, zdravlje i sigurnost zaposlenih na gradilištu	negativan	lokalan	na lokaciji	u fazi izgradnje	moгуć i dugoročan	može biti povratan i nepovratan	mala	bezbednost i zdravlje na radu

Prilozi

Prilog 01: Zaštita životne sredine i socijalno okruženje

ZAKLJUČCI:

Predložene ocene rizika za životnu sredinu i socijalni rizik (nizak).

Navedite obrazloženja:

Svi proučeni potencijalni uticaji ocenjeni su kao negativni, njihovo dejstvo je ograničena na lokalno područje na kom se javljaju, a obim je lokalizovan na gradilište potprojekta. Većina utvrđenih uticaja prisutna je u fazi izvođenja građevinskih radova na ovom potprojektu, njihovo trajanje je uglavnom kratkotrajno i svi se mogu neutralisati. Po verovatnoći, utvrđeni uticaji ocenjeni su kao malo verovatni, izuzev stvaranja otpada, koji se smatraju izvesnim. Značaj skoro svih utvrđenih uticaja je mala, izuzev uticaja koji se tiču stvaranja otpada i upravljanja otpadom, koji se smatraju umerenim.

Izveštaj o proceni uticaja na socijalno okruženje pruža detaljan pregled socijalnih rizika povezanih sa ovim projektom i odgovarajuće mere ublažavanja, pružajući informacije o odgovornostima različitih zainteresovanih strana u sprovođenju ovog Plana i čuvanja socijalnog okruženja u operativnom području ovog potprojekta. Glavne utvrđene oblasti rizika jesu mogući uticaji na zdravlje i bezbednost angažovanih radnika i stanovništva usled aktivnosti izgradnje. Socijalni rizik po porodice i decu koja će u kratkom periodu trajanja radova biti izmeštena iz svoje sobe je vremenski ograničen, biće blagovremeno i planski sproveden uz mogućnost aktiviranja žalbenog mehanizma. Obzirom na obim radova, koji je izuzetno mali, očekuje se da radovi budu završeni u roku kraćem od dve nedelje. Svest o kompenzaciji privremenog premeštanja prisutna je zahvaljujući proširenju budućih koristi, nakon završetka adaptacije.

Specijalista za zaštitu životne sredine i
socijalna pitanja

Prilog 02: Lokacije objekata u Opštini Požega



Lokacija KP br. 720 KO Zdravčiči (izvor: <https://a3.geosrbija.rs/>)

Prilog 03: Nalaz građevinskog inspektora

Република Србија
ОПШТИНА ПОЖЕГА
Општинска управа
Одељење за инспекцијске послове
-грађевинска инспекција-
03 број службено
03.03.2022. године

ОПШТИНСКА УПРАВА ПОЖЕГА
-Начелник-

ПОЖЕГА

ПРЕДМЕТ: Извештај

Поступајући по усменом налогу начелника одељења за инспекцијске послове, дана 03.03.2022. године извршио сам инспекцијски надзор изграђеног објекта ОШ „ПЕТАР ЛЕКОВИЋ“ са Предшколском установом на кат. парцели бр.720 КО Здравчићи у с. Здравчићи, Општина пожега, и том приликом, на лицу места, утврдио и записници констатовао следеће чињенично стање:

-да је на предметној локацији изграђен објекат ОШ „ПЕТАР ЛЕКОВИЋ“ са Предшколском установом,

-да је објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката и да је као такав, у евиденцији надлежног РГЗ-а, уписан у ЛН бр.2 за КО Здравчићи,

-да се део објекта користи као Предшколска установа док се део објекта користи као Основна школа,

-да је објекат грађен од чврстог материјала (пуна опека зидана у малтеру), покривен црепом преко дрвене кровне конструкције и да је фасада малтерисана и бојена фасадном бојом,

-да је визуелним прегледом предметног објекта утврђено да на објекту нема оштећења на зидовима и другим конструктивним елементима која би указивала на нестабилност конструкције објекта и небезбедност истог за коришћење, да нису видљиви угљи у међуспратној конструкцији и кровној конструкцији, као и да није дошло до слегања тла испод објекта.

С обзиром на наведено констатује се да статичка стабилност објекта није угрожена, да се објекат користи у сврху за коју је изграђен, као и да је у затеченом стању безбедан за боравак деце ван и унутар објекта.

С поштовањем,

ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР,
Дејан Ј. Ђуровски, диг



Prilog 04: Žalbeni formular

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Пројекат „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“

Жалбени формулар

Уколико имате питања или примедбе на активности и процедуре током реализације пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“, молимо Вас да попуните овај формулар.

Напомињемо да се можемо бавити искључиво питањима или примедбама директно везаним за овај пројекат, а не на општи рад Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Контакт подаци	
Ваше име и презиме и контакт подаци неће бити објављени, нити ће бити доступни јавно. Ови подаци ће бити коришћени искључиво за евентуалну даљу комуникацију са Вама у вези послатог питања или жалбе.	
Име: Овде упишите име	Презиме: Овде упишите презиме
Пол подносица питања или жалбе (служи искључиво у сврху статистичке обраде и аналитичког приказа; изјашњењем дајете пристанак на статистичку обраду података):	
<input type="checkbox"/> Мушки <input type="checkbox"/> Женски	
Електронска адреса (e-mail): Овде упишите e-mail адресу	Број телефона: Овде упишите бр. телефона
Поштанска адреса – за пријем писаног одговора (молимо Вас да упишете пуну адресу: улица и број, поштански број места и назив места):	Овде упишите поштанску адресу

Питање или притужба
Питање или опис притужбе (ово поље је обавезно попунити): Овде опишите шта је разлог Ваше притужбе
Уколико је питање или притужба везана за одређени конкретан догађај или инцидент, молимо Вас наведите место и датум где и када се то догодило, као и да ли се ради о поновљеном догађају или инциденту: Овде опишите конкретан догађај, са више детаља
Како видите решавање проблема (шта сматрате да би требало да се догоди да би се решио проблем)? Овде опишите
